

ADECUACIÓN DE LOS TÚNELES DE BELATE Y ALMANDOZ A LA DIRECTIVA EUROPEA 2004/54/CE

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Contratista: Constucciones Mariezcurrena S.L.



Presupuesto de Licitación: 4.912.725,86.- Euros.

Baja: 19,8 %

Presupuesto de Adjudicación: 3.940.006,17.- Euros.

Modificación del contrato: 3.924.799,19.- Euros.

Plazo de Ejecución: 7 Meses

Fecha de Aprobación del proyecto: 18/01/2018

Fecha de Adjudicación: 23/03/2018

Firma del Contrato: 16/04/2018

Firma del Acta de Replanteo: 16/05/2018

Comienzo de las obras: 17/05/2018

Terminación de las obras: 17/12/2018

TÚNEL DE ALMANDOZ L=1.220 m.


SISTEMA DRENAJE VERTIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS

ml colector: 1.220

ml dren: 2.003

ml rejilla: 1.270

nº arquetas sifónicas: 24

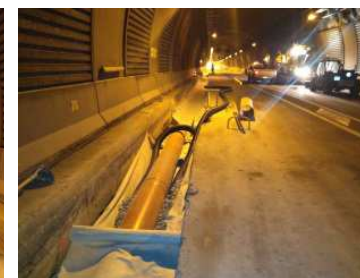

MODIFICACIÓN DE CABLEADO

9.390 ml de nuevo cable resistente al fuego

30.870 ml de cable retirado

